


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

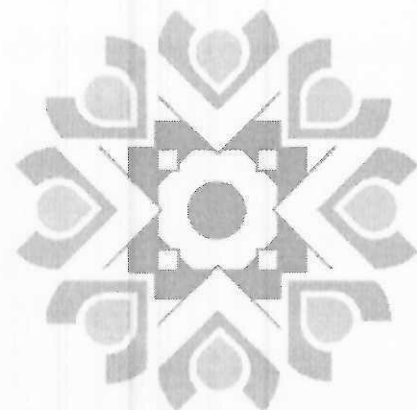

Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: توسعه ساخت و آبکاری سینی و
نردبان کابل

نام شرکت: گروه صنعتی منور گستر اسپادانا

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح توسعه کارخانه جهت تولید و آبکاری ۲۶۳،۱۵۸ متر سینی و نردبان کابل برای مدیریت هدایت کابل ها در ساخت و ساز تجاری و صنعتی در بازه زمانی دوازده ماه است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل
نام شرکت	گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۶۰۵۴۳۹۱۳
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۷۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۳۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	اصل و سود در انتهای دوره

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۲۹،۸۶۳	۶،۵۷۹	۶،۵۷۹	۶،۹۷۹
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹،۸۶۳	۱۳۶،۴۴۲	۱۴۳،۰۲۱	۱۵۰،۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷،۳۲۰	۵۵،۹۸۰	۵۵،۹۸۰	۵۵،۹۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷،۳۲۰	۹۳،۳۰۰	۱۴۹،۲۸۰	۲۰۵،۲۶۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
سهامی خاص ثبت
۳۶۸۹۷

شرکت گروه صنعتی منور گستر اسپادانا	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
------------------------------------	------------------------	------------------------------

گزارش پایان دوره طرح توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۲۹,۸۶۳	۶,۵۷۹	۶,۵۷۹	۶,۹۷۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۹,۸۶۳	۱۳۶,۴۴۲	۱۴۳,۰۲۱	۱۵۰,۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷,۳۲۰	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷,۳۲۰	۹۳,۳۰۰	۱۴۹,۲۸۰	۲۰۵,۲۶۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
سهامی خاص ثبت ۳۶۸۹۷

شرکت گروه صنعتی منور گستر اسپادانا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

جمع بندی

جدول ۵- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
۳۶.۸۴	۳۶.۸۴	سود پروژه (درصد)
۳۴	۳۴	میزان تقسیم سود (درصد)
۱۲	۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.



گروه صنعتی منور گستر اسنادانا
سهامی خاص ثبت ۳۶۸۹۷

شرکت گروه صنعتی منور گستر اسنادانا	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
------------------------------------	------------------------	------------------------------
