


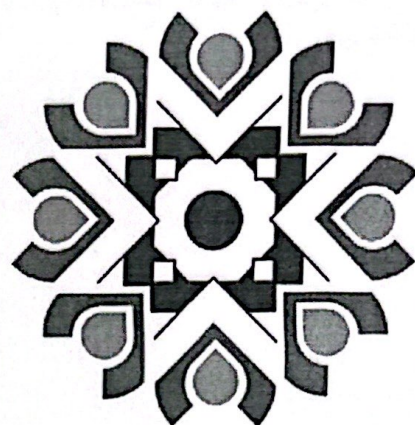

Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: قسمت ۷ کارمانی - توسعه

نیروگاه خورشیدی

نام شرکت: پارس تابلو

فروردین ۱۴۰۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش پروژه در حال اجرا فی ما بین شرکت پارس تابلو و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با موضوع قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر در قالب EPC است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۷ کارمانی - توسعه نیروگاه خورشیدی
نام شرکت	پارس تابلو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۷۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۲۱,۵۰۰	۹,۰۰۰	۹,۲۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۲۱,۵۰۰	۲۳۰,۵۰۰	۲۳۹,۷۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت پارس تابلو	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------	------------------------	------------------------------





بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۲۱,۵۰۰	۹,۰۰۰	۹,۲۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۱,۵۰۰	۲۳۰,۵۰۰	۲۳۹,۷۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت پارس تابلو

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه بیمه‌های کارآفرینی کارن

پارس تابلو
(شرکت سهامی خاص)

صفحه ۳ از ۳
بانک کارآفرین
(سهامی خاص)

