


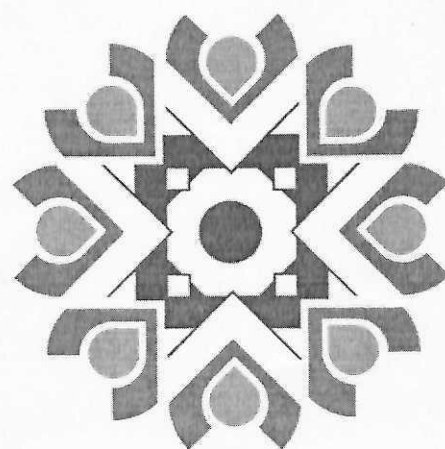

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تجهیز پنجره‌های ۱۰ بلوک

ساختمانی در شهر پرند

نام شرکت: عمران توسعه بلوا ندا پی

تیر ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

توضیحات طرح

هدف اصلی این طرح، تامین سرمایه در گردش تجهیز پنجره های استاندارد و باکیفیت برای ۱۰ بلوک ساختمانی در شهر پرند با رعایت ملاحظات فنی و زیست محیطی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تجهیز پنجره های ۱۰ بلوک ساختمانی در شهر پرند
نام شرکت	عمران توسعه بلوا ندا پی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۷۱۸۷۲۳۹
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۹۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۰۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۲۳,۵
مدت زمان طرح (ماه)	۶
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱,۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۲۸,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۲۸,۵۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۳,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۳,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰

شرکت عمران توسعه بلوا ندا پی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
------------------------------	------------------------	------------------------------

عمران توسعه بلوا ندا پی
شماره ثبت: ۵۲۴۳۱۴
سهامی خاص

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های واقعی	۲۲۸,۵۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲۲۸,۵۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۶۳,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۶۳,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰

شرکت عمران توسعه بلوا ندا پی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کار

عمران توسعه بلوا ندا پی
سهامی خاص

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

