


گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

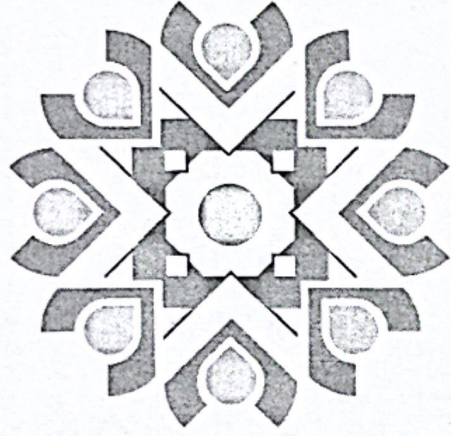

Karen Crowd

گزارش میان دوره دوم طرح: سرمایه در گردش احداث و

بهره‌برداری Mini-NGL

نام شرکت: هیربد نیرو

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش احداث و بهره‌برداری از یک واحد mini-NGL جهت بازاریابی و فروش گاز های ارسالی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	سرمایه در گردش احداث و بهره‌برداری Mini-NGL
نام شرکت	هیرد نیرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۱۰۶ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪ درصد

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۴۸,۲۵۰	.
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴۸,۲۵۰	۲۴۸,۲۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۸۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۸۲,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۸,۲۵۰	۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۸,۲۵۰	۲۴۸,۲۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۸۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۸۲,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت هیرید نیرو
