


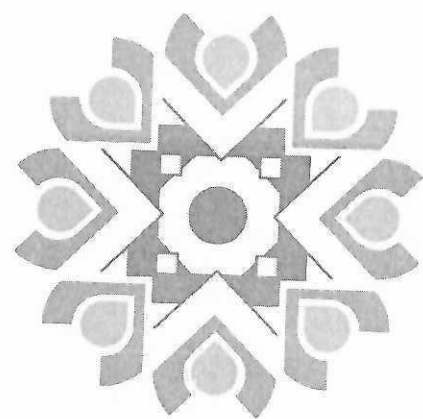

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: سرمایه در گردش احداث و
بهره برداری Mini-NGL

نام شرکت: هیربد نیرو

بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش احدث و بهره‌برداری از یک واحد mini-NGL جهت بازاریابی و فروش گاز های ارسالی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	سرمایه در گردش احدث و بهره‌برداری Mini-NGL
نام شرکت	هیرید نیرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۱۰۶ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪ درصد

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۴۸,۲۵۰	۰	۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴۸,۲۵۰	۲۴۸,۲۵۰	۲۴۸,۲۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۸۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۸۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۸۲,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰	۲۶۶,۵۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

سرگت هیرید نیرو کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرین کارن

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۸,۲۵۰	.	.
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۸,۲۵۰	۲۴۸,۲۵۰	۲۴۸,۲۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۸۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۸۲,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰	۲۶۹,۵۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵




شرکت هیربکس نیرو کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

تاریخ

کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)





شماره قرارداد: HN-P-MRN-03-39
قرارداد تأمین کالا



قرارداد تأمین کالا

طرفین قرارداد:

شرکت هیبرید نیرو (کارفرما) - تأمین کننده

شماره قرارداد: HN-P-MRN-03-39

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

موضوع قرارداد:

تأمین کالای پروژه جمع‌آوری و فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی

مارون ۳ آسماری، مارون ۳ بنگستان و مارون ۵

تعداد کل صفحات (با پیوست‌های مربوطه): ۳۶ صفحه



۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح

شرکت هیبرید نیرو

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرین کارن

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)
