


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

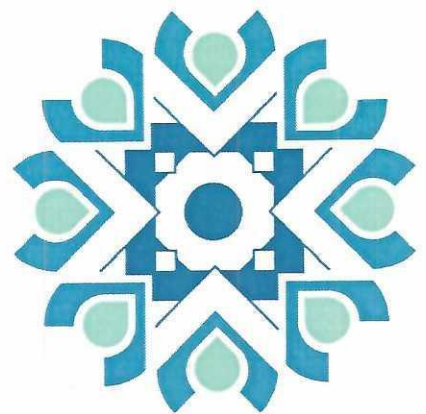

Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: فرآورش گازهای مشعل میدان
نفی بنگستان

نام شرکت: هیربد نیرو

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش فرآورش گاز های مشعل ارسالی به میدان نفتی بنگستان است. درآمد پیش بینی شده طرح ۹۰۲,۴۳۱ میلیون ریال است که از طریق فروش گاز سبک حاصل می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی بنگستان
نام شرکت	هیرید نیرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۶۰ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۷,۳۵۹	۲۴۷,۳۵۹	۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۵۷,۳۵۹	۵۰۴,۷۱۸	۵۰۴,۷۱۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۲,۸۰۴	۳۳۸,۴۱۲	۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۲,۸۰۴	۴۵۱,۲۱۶	۴۵۱,۲۱۶

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۳	۳۷	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۳	۵۰	۷۵



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت هیرید نیرو
------------------------------	------------------------	-----------------

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۵۷,۳۵۹	۲۴۷,۳۵۹	۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۷,۳۵۹	۵۰۴,۷۱۸	۵۰۴,۷۱۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۱۲,۸۰۴	۳۳۸,۴۱۲	۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۱۲,۸۰۴	۴۵۱,۲۱۶	۴۵۱,۲۱۶

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۳	۳۷	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۳	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
سایر هزینه‌های تولید	۲۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه مالی - حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۲۵۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت هیریدنیرو
