


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

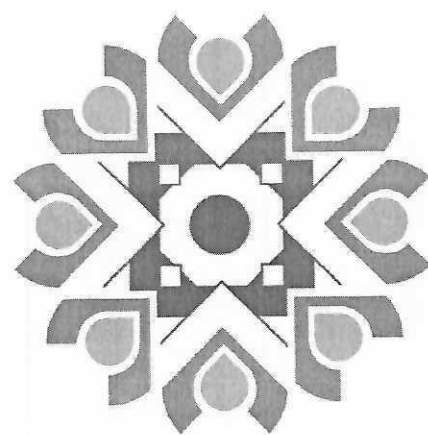

Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری

شرکتی

نام شرکت: الکام توسعه آماد

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع‌بندی طرح ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم ها و پنل های بانکداری شرکتی برای تسهیل خدمات مالی شرکت های حقوقی است. منابع این طرح صرف هزینه کرد خرید، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های طرح، هزینه حقوق دستمزد و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی
نام شرکت	الکام توسعه آماد
شناسه ملی متقاضی	۱۰۶۳۰۱۸۴۷۹۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۳۵
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۶,۸۱۷	۳۷,۰۱۷	۲۸,۳۳۱	۴۶,۹۵۹
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۶,۸۱۷	۲۲۳,۸۳۴	۲۶۲,۱۶۵	۳۰۹,۱۲۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۴۲۰	۹۱,۰۲۰	۱۱۵,۴۶۰	۱۵۵,۳۸۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۱,۴۲۰	۱۵۲,۴۴۰	۲۶۷,۹۰۰	۴۲۳,۲۸۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کار	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت الکام توسعه آماد
-----------------------------	------------------------	-----------------------

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۸۱،۵۰۰	۳۸،۳۳۱	۳۸،۳۳۱	۴۶،۹۵۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۱،۵۰۰	۱۱۹،۸۳۱	۱۵۸،۱۶۲	۲۰۵،۱۲۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۱،۰۰۰	۶۱،۴۰۰	۱۱۵،۴۶۰	۸۷،۸۰۱
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۱،۰۰۰	۱۰۲،۴۰۰	۲۱۷،۸۶۰	۳۰۵،۶۶۱

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴	۳۰	۳۱	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۴	۴۴	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰	۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌های طرح	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۷۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۳۵۹،۰۰۰،۰۰۰
هزینه مالی-حسابرسی	۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۸۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۳۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۳۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۶،۹۵۹،۰۰۰،۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۳۳۳۸۱
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۸۸

شماره ثبت: ۵۱۹۲۶۹۱
شرکت الکام توسعه

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۳۳۳۸۱
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۸۸

جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۴۲۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۱۰۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایر هزینه های طرح	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه های عمومی - اداری	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه مالی - حسابرسی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۳۰۹,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۱۱۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		٪۷۶.۱	٪۶۷.۰۳	٪۶۷.۰۳

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
٪۷۶.۱	٪۶۷.۰۳	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)



- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ٪۴۴ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

امضاء

شماره ثبت: ۵۱۹۷۶۴
شرکت الکام توسعه آماد

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارین
